



VÝSTAVBA-BUNGALOW

75 M2



DOBA VÝSTAVBY 6,5 HODIN PŘI 3-
LIDECH

Prezentace výstavby systémem MODUL-LEG

Společnosti SubteraS KV s.r.o.


www.SubteraS.cz

www.stavbabezstarosti.cz

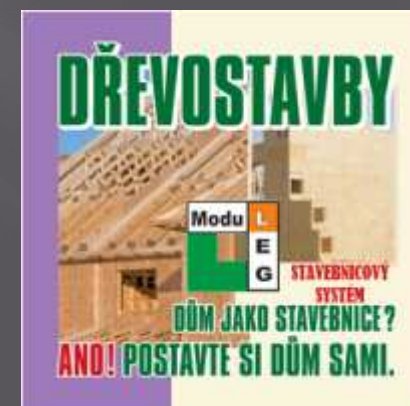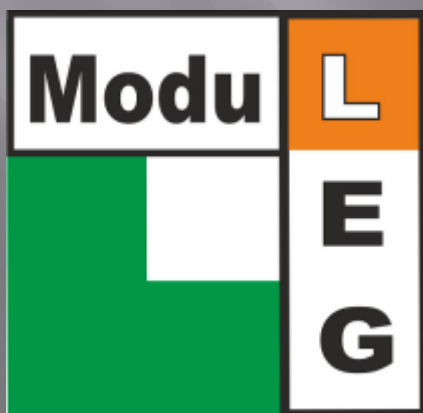


Vše začíná pozemkem.....

- Srovnání pozemku
- Vytýčení laviček



Základová deska

- Příprava základové desky na zalití a následné zalití
- Použitý beton C 16/20






Základové prahy systému Modul-Leg

montáž prahů 1,5 hodiny



Rozměření a montáž základových prahů
Prahy se šroubují do základové desky dle
námi dodané dokumentace

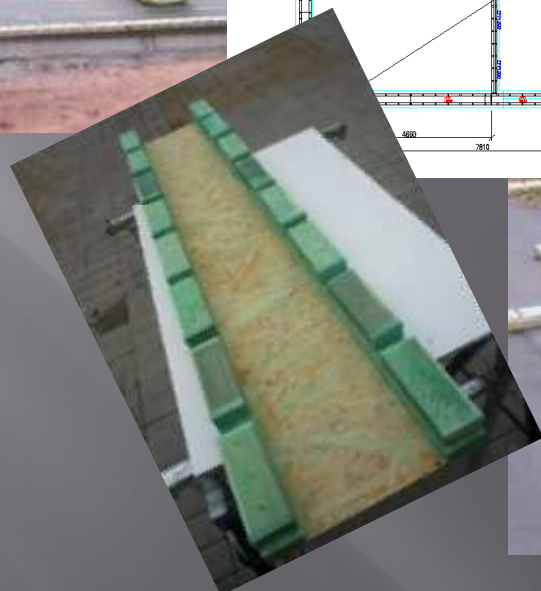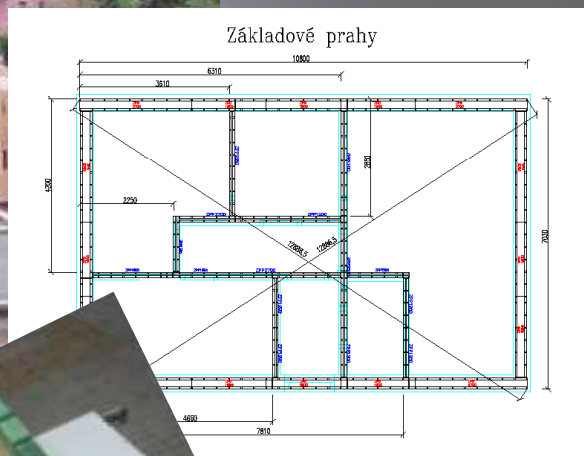


Začátek 1 a 2-vrstvy doba pokládky : 45 min

Moduly jsou kladeny dle kladečského plánu
Každý modul je označen vlastním číslem

Obvodové moduly jsou z desek OSB
na vnitřní moduly byly použity desky lamino



Každá vrstva trvá včetně vrstvy příčkové
(a vč. zvukové izolace) v průměru 25 minut
a to ve třech lidech.

Na tomto domě bylo použito 10-vrstev a to
včetně vrstvy 10.-věnce



3.Vrstva a položení perlínkového pásu


Do třetí vrstvy je vložen pás z výztužné tkaniny (perlínky)
Je to z důvodů úplného naplnění modulů celulózu (climatizérem)
Celulóza se aplikuje vždy po každých třech řadách a to z důvodu, abychom si byly jisti, že je vše plněno přesně na $60\text{kg}/\text{m}^3$ a nemůže tak dojít k nedoplnění či časovému propadávání celulózových vláken.

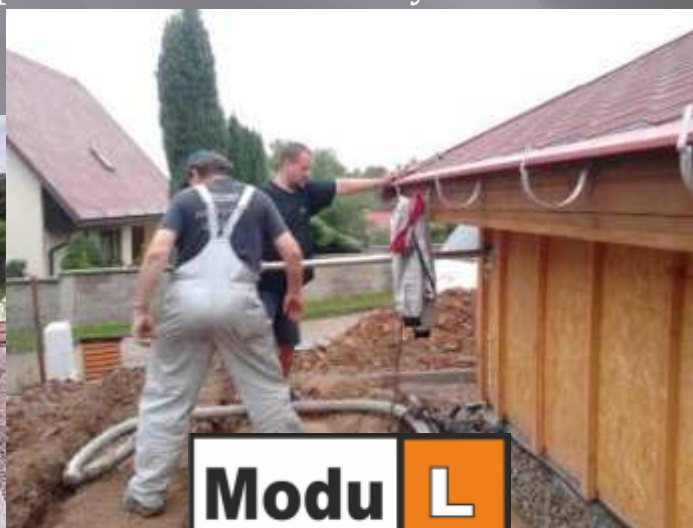

Poslední vrstva věnce a izolace


Položení poslední vrstvy věnců a vrstvy izolační-dilatační.
Tak a po 6,5 hodinách hraní včetně přestávek je vše připraveno na pokládku vazníků.

Toto jde pouze s naším unikátním systémem Modul-leg




Pokládka Vazníkové konstrukce

Unikátní systém Modul-Leg je rychlá výstavba bez použití veškerých zvedacích zařízení.....až tedy na vazníky
Ale i to bychom bez jeřábu zvládly....jako třeba na další stavbě



No a končí to předání s klíčem



www..SubteraS.cz

www.stavbabezstarosti.cz

Popis a foto interiéru

Typ rodinného domu: Bungalow 3+kk

Investor: p.Macháček p.Macháčková


Lokalita: Sokolov-Citice

Čas stavby na klíč: 3-měsíce (bez zahradních úprav)

Cena domu ve standardu: 1 348 000,-Kč bez DPH

Počet montážníků na stavbě: 3-4

Typ: ÚED-úsporně energetický dům

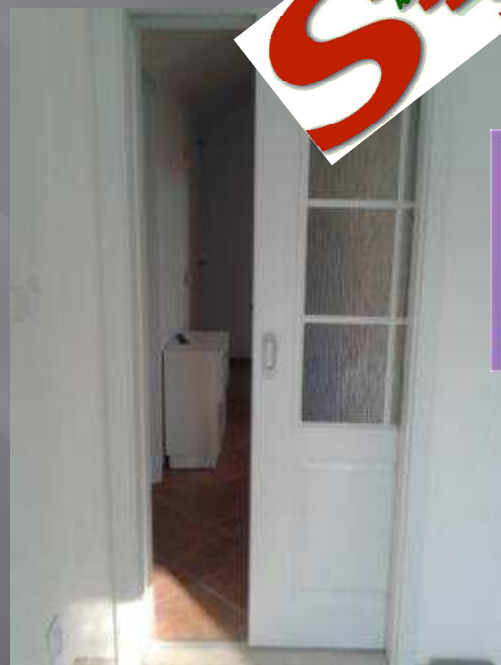

STUBTERAN
KOMPLETNÍ KV VÝSTAVBA
S.R.O.

